

Tablica Kanban

Rozproszona współpraca agentów LLM

1. O projekcie i produkcji

Projekt dyplomowy inżynierski “Rozproszona współpraca agentów LLM” jest kontynuacją projektu grupowego “Rozproszona współpraca LLM inspirowana umysłami rojowymi”.


Celem projektu jest implementacja systemu rozproszonej współpracy agentów LLM z koordynacją zdecentralizowaną oraz porównanie właściwości systemowych i jakości generowanych odpowiedzi podczas równoległej i rozproszonej współpracy agentów LLM

2. Stany zadań

2.1. Opis stanów

Stan / kolumna	Opis	Kryterium przejścia
Proposed	Zadania zaproponowane ale nie zaakceptowane jeszcze przez zespół.	(→ <i>Todo</i>) Zespół przedyskutował zaproponowane zadanie i zdecydował się, że jest potrzebne / możliwe do wykonania
Todo	Zadania zaakceptowane przez zespół jako wykonalne / potrzebne	(→ <i>In Progress</i>) Dowolny członek zespołu rozpoczął pracę nad danym zadaniem
In Progress	Zadania nad którymi obecnie wykonywane są jakieś prace	(→ <i>Pending Testing</i>) Wykonywanie zadania zostało zakończone i oczekuje ono na testy (→ <i>Testing</i>) Bezpośrednio po zakończeniu wykonywania zadania wykonywane zostają testy
Pending Testing	Zadania nad którymi zakończyła się praca - oczekują na przeprowadzenie odpowiednich testów	(→ <i>Testing</i>) Rozpoczęte przeprowadzanie testów
Testing	Testowanie m.in. poprawności działania wykonanego zadania	(→ <i>In Progress</i>) Testowanie wykryło błędy / problemy, zadanie jest poprawiane (→ <i>Done</i>) Testowanie przebiegło pomyślnie, zadanie zostało zakończone a kod umieszczony w repozytorium
Done	Zadanie wykonane poprawnie i przetestowane; wykonany kod umieszczony w repozytorium (zadanie spełnia DoD)	Ostatni stan – brak kolejnych przejść


2.2. Diagram możliwych przejść między stanami

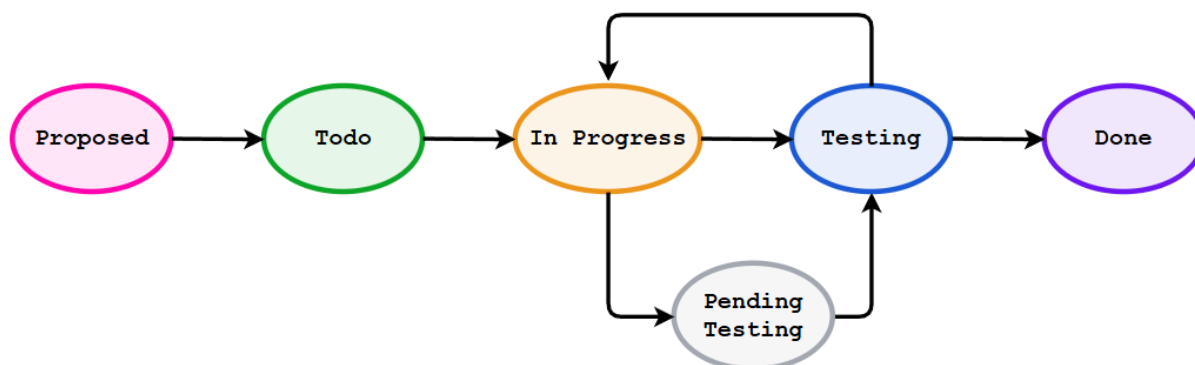

3. Limity WIP

Stan / kolumna	Limit	Uzasadnienie
Proposed	—	Pozycje w tej kolumnie są jedynie pomysłami / propozycjami. Zespół nie jest zobowiązany do wykonania zadania – na tym etapie konieczne jest jedynie przedyskutowanie go.
Todo	8	Ilość pozycji jest cztery razy większa niż wielkość zespołu projektowego. Zakładamy, że każdy członek zespołu powinien mieć po 4 zadania do wykonania.
In Progress	4	Ilość pozycji jest dwa razy większa niż wielkość zespołu - zakładamy, że każdy członek zespołu powinien pracować maksymalnie nad dwoma nowymi zadaniami jednocześnie.
Pending Testing	2	Ilość dostępnych w tej kolumnie pozycji odpowiada ilości członków zespołu. Mała ilość dostępnych zgłoszeń zmusza zespół do testowania wcześniej wykonanych zadań.
Testing	2	Mała ilość zadań zmniejsza ryzyko konfliktów przy późniejszym scalaniu kodu. Jako, że testowane zadania mogą dotyczyć ‘niezależnych’ od siebie elementów nie ma konieczności testowania tylko jednego zadania na raz.
Done	—	Pozycje w tej kolumnie to zadania już zakończone - prace nad nimi już się zakończyły, więc limit nie jest konieczny.


4. Tablica Kanban

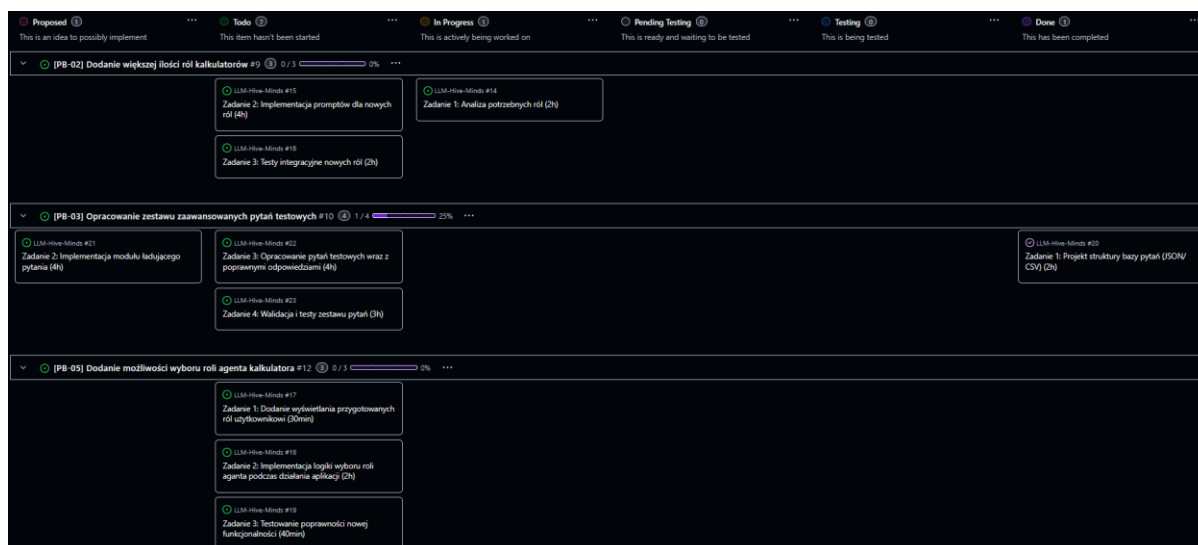

5. Metryki produktywności

5.1. Bottleneck

Miara pozwala nam sprawdzić, czy któryś ze stanów nadmiernie ‘wypełnia’ się zadaniami. W celu zobrazowania tej metryki w narzędziu wspomagającym (GitHub projects) generowany jest graf słupkowy obrazujący ilość zadań przypisanych każdemu stanowi

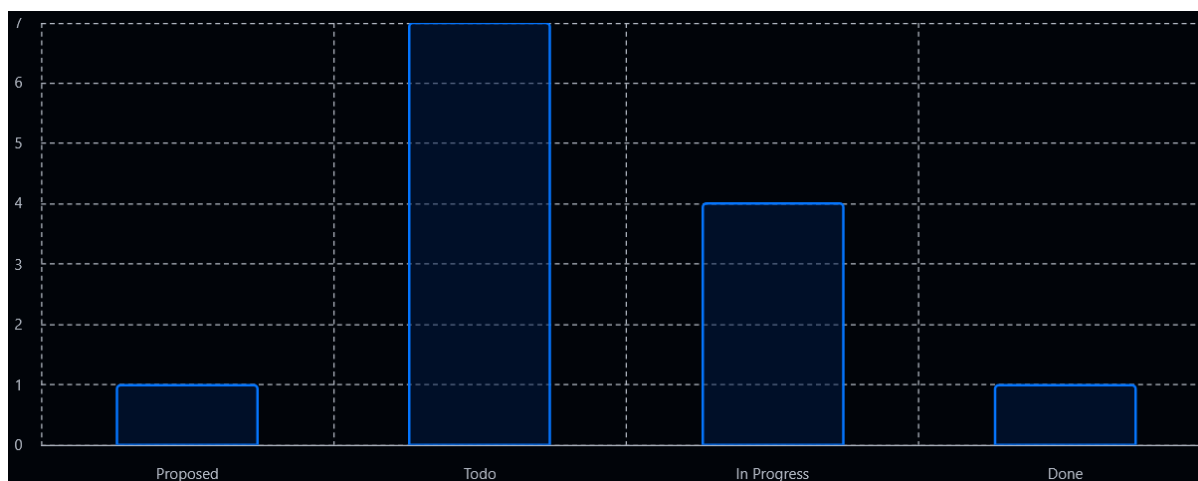

5.2. Rozkład stanów

Rozkład stanów pozwala nam w łatwy sposób zobaczyć który z elementów backlogu produktu potrzebuje największego wkładu pracy, który jest bliski finalizacji itp.

